




OCTUBRE 2026



PROPUESTA DE PILOTO · BETTERWARE MÉXICO


Programa Insiders Betty mejorada

Piloto cerrado con distribuidoras aliadas · 16 → 23 octubre 2026

Validar con usuarias reales las mejoras internas en el agente de servicio antes del lanzamiento al 100% de la red. Betty sigue siendo Betty – con menos fallos y respuestas más claras.

Jonathan Gomez

Salesforce · Forward Deployed Engineer

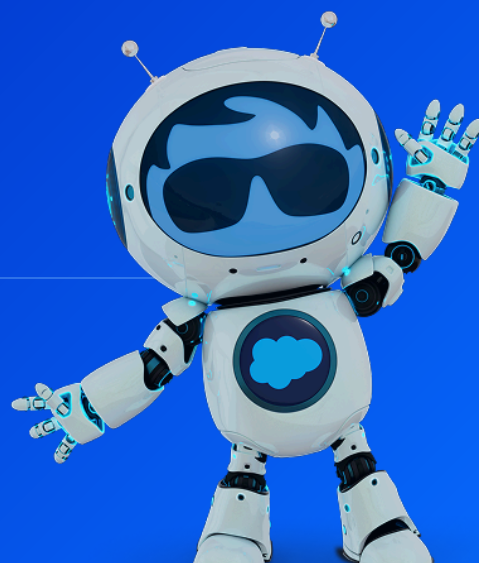

1 · EL PROGRAMA

Qué es el Programa Insiders

Un piloto cerrado de 8 días con un grupo seleccionado de distribuidoras aliadas de Betterware. Durante este período, las distribuidoras invitadas usan Betty tal como la usan hoy – pero por detrás, una implementación técnica más robusta responde sus mensajes.

Betty sigue siendo Betty.

No es un Betty 2.0. Es la misma Betty que las distribuidoras ya conocen, con una base técnica reconstruida para dar menos fallos y respuestas más claras. El piloto nos permite validar las mejoras internas con usuarias reales antes de abrir al 100% de la base.

- **Objetivo:** validar con usuarias reales las mejoras antes del rollout al 100% de la base de distribuidoras.
- **Posición clave:** no es un reemplazo visible – es Betty con menos fallos silenciosos, menos escalaciones innecesarias y respuestas más específicas.
- **Qué significa para la distribuidora piloto:** reconocimiento como aliada estratégica + voz privilegiada en el futuro del servicio.

2 · ALCANCE

Alcance explícito del piloto

Delimitar qué está en alcance y qué no evita scope creep y mantiene la ventana del piloto manejable en 8 días.

Dentro del alcance

Lo que las distribuidoras piloto deben probar:

- ✓ Autenticación por código de distribuidora o referencia bancaria
- ✓ Consulta de saldos y pagos
- ✓ Consulta de pedidos y seguimiento
- ✓ Consulta de puntos BwPlus
- ✓ Consulta y registro de altas de asociadas
- ✓ Tickets ServiceNow
- ✓ Reseteo de contraseña
- ✓ Preguntas generales (FAQ)
- ✓ Escalación a humano cuando aplica

Fuera del alcance

Lo que **no es parte** del piloto:

- ✗ Features nuevas que hoy Betty no hace
- ✗ Canales distintos a WhatsApp
- ✗ Cambios en el programa BwPlus, Credilazos u otros productos
- ✗ Cambios en procesos de back office
- ✗ Nuevos idiomas o regiones

3 · ESTRUCTURA

Cómo opera el programa

Tamaño inicial	15 – 25 distribuidoras seleccionadas por Betterware
Perfil	Super usuarias activas · con historial de retroalimentación · representativas de distintos tipos de intents (pedidos, pagos, BwPlus, altas, saldos)
Duración	8 días · del viernes 16 octubre al viernes 23 octubre 2026
Canal de feedback	Grupo de WhatsApp dedicado + formulario rápido semanal (3 preguntas: qué funcionó, qué no, qué cambiarías)
Reconocimiento	A definir con Betterware: mención interna, acceso temprano a próximas mejoras, pin digital, certificado de participación
Comunicación	Mensaje de bienvenida enviado por Betterware (no por Salesforce) · onboarding corto · canal directo con Customer Success de Betterware

4 · RESPONSABILIDADES

Quién hace qué

Cada parte tiene un rol diferenciado – Salesforce propone y construye, Betterware cura y comunica.

Salesforce (FDE)

propone, construye y opera

- › Diseño técnico del piloto: routing por Flow + marca FDE_Pilot__c en MessagingEndUser
- › Deploy del agente nuevo + cohorte controlada por checkbox
- › Framework de medición comparativa
- › Playbook del programa: narrativa, invitación, formulario
- › Monitoreo diario + reporte del comportamiento
- › Soporte operativo y técnico de 1er nivel durante la ventana del piloto

Betterware (CS)

aprueba, cura y comunica

- › Approval del deploy a producción
- › Lista de 15 – 25 distribuidoras candidatas
- › Invitación formal con la narrativa del programa
- › Administración del grupo WhatsApp de las piloto
- › Punto de contacto para dudas de las piloto
- › Reconocimiento final al cerrar el piloto

5 · TIMELINE

Línea de tiempo del piloto

- Lun 12 OCT** · Betterware entrega lista final de distribuidoras piloto a Salesforce. Se marcan los MessagingEndUser con FDE_Pilot__c.
- Jue 15 OCT** · Approval firmado · agente nuevo publicado en producción como bot activo · smoke test interno con un número del piloto.
- Vie 16 OCT** · **CUTOVER 10%** · grupo WhatsApp abierto · mensaje de bienvenida enviado por Betterware a las primeras distribuidoras del piloto.
- Lun 19 → Jue 22 OCT** · Escalada diaria de +10% (20 → 30 → 40 → 50%). Daily standups con FDE + Betterware. Formulario rápido a las piloto al cierre de cada día.
- Vie 23 OCT** · 🎯 **GA · Flujo total General Available** · el agente nuevo queda como el flujo general para todas las distribuidoras. Reconocimiento al grupo piloto + demo de aprendizajes a Betterware.
- Lun 26 OCT** · Arranca **Etapas de Reconstrucción y Modernización** · reemplazo gradual de acciones legacy en base a los aprendizajes del piloto.

6 · MÉTRICAS

Métricas de éxito del piloto

No son los KPIs de producción. Son métricas experienciales que validan la decisión de rollout.

NPS cualitativo del grupo piloto	≥ 70% recomendaría
% de intents validados funcionando correctamente	≥ 85% de los flujos
Bugs levantados y resueltos durante la ventana	0 críticos abiertos
Flujos sugeridos para mejoras futuras	Insumo del roadmap

7 · RIESGOS ATENDIDOS

Lo que mitiga este enfoque

El piloto se diseñó para que el reemplazo del agente ocurra con red de seguridad: cada riesgo tiene una mitigación concreta antes de abrir al 100% de la base.

RIESGO	MITIGACIÓN
Scope creep durante el piloto	Alcance explícito comunicado desde la invitación. Toda sugerencia fuera de alcance va al roadmap, no al piloto.
Feedback negativo público	Grupo WhatsApp cerrado + punto de contacto directo con Betterware + respuesta rápida ante cualquier incidencia.
Falla con una piloto crítica	Kill-switch global + rollback inmediato en segundos. El agente actual (V40) queda intacto como respaldo.
Confusión interna (¿nuevo agente?)	Narrativa clara: <i>mejoras internas en Betty, no agente nuevo</i> . Mismo nombre, misma persona, mejor base técnica.

8 · ACTIVACIÓN

Siguiente paso concreto

Para que el piloto arranque el viernes 16 de octubre, estos son los hitos a cerrar esta semana. Cada uno es un paso ejecutable con un responsable claro.

De aquí al arranque · 10 días

Mar 06 OCT	Kick-off con Betterware CS. Propuesta validada; se solicita curaduría de distribuidoras candidatas.
Mié 07 OCT	Inicio de curaduría por Betterware. Primera lista preliminar (10-15 candidatas) para validación.
Jue 08 → Sáb 10	UAT con Betterware · prueba del agente en sandbox contra escenarios reales.
Lun 13 OCT	Lista final de 15 – 25 distribuidoras piloto confirmada. Comunicación de invitación lista para enviar.
Jue 15 OCT	Approval firmado · agente nuevo publicado en producción con feature flag OFF · smoke test interno.
Vie 16 OCT	ACTIVACIÓN del Programa Insiders · Betty mejorada arranca para el grupo piloto.
