
OCTUBRE 2026

ESTADO DEL PROYECTO · PAM HOTELS

Agente Concierge Digital

Paradise Pass · V5 Active en PAM-Sandbox · camino al go-live pre Legends of Paradise

Snapshot ejecutivo al 12-oct-2026. Lo que está construido, lo que queda abierto y la ruta de cierre a las 7 semanas que faltan.

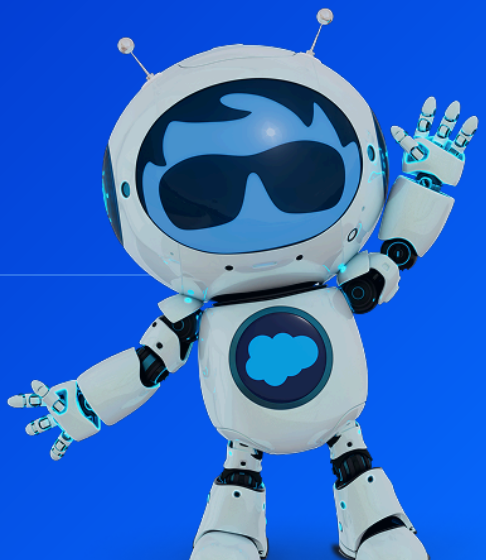

Jonathan Gomez
Salesforce · Forward Deployed Engineer

1 · TL;DR

En 60 segundos

El Concierge Digital de Paradise Pass lleva **V5 Active en Sandbox desde el 2026-07-08**. Los 8 subagentes del MVP están construidos, enganchados a 15 acciones reales (Apex + Flow + Prompt Templates) y pasan el gate de autenticación de 3 fases. Lo que queda es **cerrar 4 open items técnicos**, publicar **7 KB Articles aún en Draft** y correr **UAT con operación PAM** antes del evento ancla de diciembre.

El agente ya estaba por finalizarse. Hoy la ruta a producción se mide en semanas, no en meses.

Al 12-oct quedan 7 semanas de calendario hasta el go-live pre Legends of Paradise (6-13 dic). F3 Pre-prod hardening está en curso, F4 UAT arranca 2026-11-03, F5 Go-live aterriza antes del 2026-12-05.

8	15	44	3
Subagentes productivos	Acciones conectadas (10 Apex + 6 Flow + 2 Prompt)	KB Articles Online (+ 7 Draft)	Idiomas en producción es · en · pt

Lo que ya funciona

- ✓ Autenticación 3 fases (identify fuzzy + challenge personal + OTP email)
- ✓ Dashboard de certificados Paradise Pass a nivel socio
- ✓ Programa de referidos con creación de Lead al owner del contrato
- ✓ Entrega de formulario de beneficiarios en es/en/pt
- ✓ Políticas críticas (huracán, reventa, phishing) citables desde KB
- ✓ Ruteo preferente al asesor del contrato en handoff
- ✓ Multicanal: WhatsApp, Embedded Messaging, Email, Facebook, Line, Apple Business Chat

Lo que queda abierto

- ◐ Integración OWS (Opera Web Services) para notificación automática al hotel
- ◐ Creación automática de Case para disputas/reembolsos (pendiente queue)
- ◐ Retriever R2 UDMO-Destinations para enganchar KB a Destinations
- ◐ 7 KB Articles Draft por validar (incluye UNICO Jamaica y Paradise Pass mechanics)
- ◐ Matriz UAT y UAT formal con operación PAM
- ◐ Deployment Sandbox → Production + comunicación al Contact Center

2 · EL AGENTE

Qué es el Concierge Digital

Un Anfitrión Exclusivo y Concierge Experto para socios autenticados de Paradise Pass. Resuelve consultas 24/7 sobre membresía y certificados, beneficiarios, referidos, destinos, estado de cuenta, cambios de llegada y políticas críticas – y enruta temas complejos al equipo humano correcto.

BotDefinition	`Agente_ConciergeDigital` · ID `0XxO40000006sVZKAY`
Autor inicial	Regina Segura (2026-06-23) · modificado por Jonathan Gomez (2026-07-08)
Versión activa	**V5 Active desde 2026-07-08** (BotVersion `0X9O40000003gNhKAI`) · 5 versiones iteradas
Agent Template	`SvcCopilotTmpl__AgentforceServiceAgent` · Agent Script DSL
Org	PAM-Sandbox (`00DO0400000YzKHZMA3`) · 90 objetos custom · 220 record types
Audiencia	Socios **autenticados** de Paradise Pass (no clientes LVC, no público general)
Idiomas	Primary `en_US` · secondary `es_MX`, `pt_BR`, `en_GB` · adaptive=true
Canales	Text, WhatsApp, Email, Facebook, Line, Apple Business Chat, Embedded Messaging, Custom
Tono	Casual · cálido, exclusivo, consultivo · frases breves · sin markdown · empatía + transparencia + alternativa
Bot user	`lvc_digital_concierge@00do400000yzkhz2118844205.ext`
MLDomain	`LVC_ConciergeDigital`

Diseñado para no confundir audiencias.

Paradise Pass es producto de descubrimiento y activación; LVC es producto de pertenencia. El bot nunca cita LVC a un cliente PPass salvo en flujos explícitos de upgrade. Audiencia detectada en sesión + idioma del Account.Language__pc normalizado a es/en/pt.

3 · ARQUITECTURA

Los 8 subagentes productivos

Agent Router aplica `before_reasoning` para forzar autenticación antes de cualquier acceso a datos. Cada subagente tiene instrucciones propias, un set acotado de acciones, guardrails explícitos y una transición clara al enrutador o a Human_Handoff.

1 · Authentication — DONE

3 fases: identify by name+phone fuzzy → desafío personal (4 campos privados) → OTP email con PAM_OTP__c (TTL 5 min, bloqueo tras 3 fallos, reenvío con contador).

5 Apex: PAM_IdentifyMemberByNameAndPhone · PAM_GetChallengeQuestion · PAM_VerifyPersonalChallenge · PAM_SendOtpEmail · PAM_VerifyOtp

2 · Membership_Account — DONE

Dashboard de certificados a nivel socio: todos los contratos PPass con counts por categoría (Paid in Full · Balance Due · Expiring Soon · Cancelled · Redeemed). Beneficiarios solo lectura. Statement por email con confirmación.

4 Flows: PAM_DG_GetActiveContract · PAM_DG_GetMembershipAndBalance · PAM_DG_GetBeneficiaries · PAM_DG_SendStatementEmail

3 · Beneficiary_Modification — DONE

Entrega formulario oficial en idioma del socio (es/en/pt). NO procesa cambios en línea · requiere documento firmado enviado por email. Prohíbe recoger datos de beneficiarios.

1 Flow: PAM_DG_GetBeneficiaryFormLink

4 · Benefits_Referrals — DONE

Certificados + programa de referidos. Regla crítica: certificado "Expired" aún es utilizable. Lead creation con validación de teléfono local (sin lada internacional) y país normalizado automáticamente.

3 Flows: PAM_DG_GetActiveContract · PAM_DG_GetMembershipAndBalance · PAM_DG_CreateReferralLead (RT VCL_Referral_Leads_PPASS)

5 · Destinations — PARTIAL

Primer filtro conversacional: 3 preguntas de descubrimiento (semana prepagada vs. descuento · zona + fechas · personas) → handoff al asesor. **Pendiente: retriever R2 UDMO-Destinations.**

Solo transiciones. Sin acciones de datos. Diseño R2 pendiente de implementación.

6 · Preferences — DONE

Cambio de idioma de la sesión actual (es/en/pt). Sin DML · no persiste cambios en el Account. Si pide otro idioma, continúa en el más cercano.

Solo `setVariables` interno. 0 acciones externas.

7 · Arrival_Support — PARTIAL

Lista reservas, pregunta explícitamente por fecha de salida. Si salida NO cambia → avisa al hotel. **Fallback actual escala a asesor humano · integración OWS en construcción.**

1 Apex: PAM_GetMemberReservations · pendiente Flow PAM_DG_NotifyHotelArrivalChange con OWS

8 · Critical_Policies — DONE

Huracán · reventa · phishing. Fuente ÚNICA KB. Califica si el socio ya fue víctima (si sí → escala directo). Nunca parafrasea · si no hay artículo crea Case.

1 Apex: PAM_CreateCaseForKBEmpty · 2 Prompt Templates: FWD_PPass_KB_Policies_Response · FWD_PPass_KB_Security_Response

9 · Human_Handoff

PARTIAL

Ruteo preferente al owner del contrato vía Omni-Channel. Si no hay owner → cola general. Creación de Case de cancelación para Reservaciones. **Pendiente: queue y Case automation para disputas/reembolsos.**

3 Apex: PAM_SetSessionContractOwner · PAM_RouteToSpecificAgent · PAM_CreateCaseForCancellation · pendiente PAM_CreateCaseForDispute

4 · KNOWLEDGE BASE

Inventario KB · 44 Online + 7 Draft

Al 12-oct hay 44 artículos publicados Online + 7 Draft (de 42 master en español, 126 versiones con traducciones a inglés y portugués). El cuello de botella hoy no es el contenido – es validar los 7 Draft con el Content Owner de PAM.

RECORD TYPE	TOTAL MASTER	VALIDATED	IN REVIEW	PLANNED	BLOQUEANTES CLAVE
Property Fact Sheet	9	8	1	0	KA-PFS-009 UNICO Jamaica · pendiente confirmar si aplica Paradise Pass
Policy	9	8	1	0	KA-POL-003 No-Show · PND-001 contradicción documental 1,200 vs 1,500 USD
Benefit & Program	4	1	0	3	Sin fuente oficial de mecánica Paradise Pass (PND-008) · KA-BEN-001/002/004 bloqueados
FAQ Article	10	10	0	0	–
How-To / Self-Service	7	6	0	1	KA-HOW-001 Estado de Cuenta por Email · plantilla no entregada (PND-009)
Security	3	3	0	0	Carpetas Phishing/ y Llamada Sospechosa/ VACÍAS (PND-005)
Total MVP	**42**	**36**	**2**	**4**	**86% Online · faltan 6 piezas de contenido oficial**

PND-010 · Validation Status desalineado. Los 36 artículos ya Online quedaron con `FWD_Validation_Status__c = Draft` porque se publicaron antes de implementar el ciclo editorial. Re-versionar en F3 para alinear picklist y PublishStatus (impacto: solo reporting interno · no afecta el bot).

Los 7 Draft en PublishStatus — detalle

- **KA-PFS-009** UNICO Jamaica Montego Bay · fact sheet oficial no menciona Paradise Pass. Decisión: Lifecycle=Legacy o esperar confirmación cliente.
- **KA-POL-003** Política de No-Show Fechas Especiales · contradicción 1,200 vs 1,500 USD en el mismo PDF. Pide a Legal firmar monto 2026.
- **KA-BEN-001** Paradise Pass · Cómo Funciona · bloqueado por falta de doc oficial de mecánica (certificado, activación, vencimiento, 4/5 vs 7/8 noches). Alternativa: autorizar scraping de paradisepass.com como fuente citable.
- **KA-BEN-002** Member's Bracelet & Resort Credits · bloqueado por la misma causa (PND-008).

- **KA-BEN-004** Legends of Paradise 2026 · bloqueado por la misma causa + brief oficial del evento pendiente.
- **KA-HOW-001** Estado de Cuenta por Email · bloqueado por plantilla de correo no entregada (PND-009).
- +1 legacy pre-rebranding (Procedure RT) · marcar Lifecycle=Legacy y mover.

5 · OPEN ITEMS TÉCNICOS

Lo que falta cerrar antes de UAT

Cuatro open items quedaron explícitamente marcados en el bundle V5 Active. Tres son dependencias de PAM IT u Operación · el cuarto es desarrollo pendiente. Ninguno es bloqueante del go-live si entregamos con sus fallbacks actuales – pero son los que elevan la propuesta de valor del agente.

OI-01 · Integración OWS para Arrival_Support

- **Qué** – Connector a Opera Web Services (Oracle Hospitality) para notificar automáticamente al hotel cuando solo cambia el itinerario de llegada
- **Hoy** – Arrival_Support captura el cambio y escala a asesor humano (fallback funcional)
- **Owner** – PAM IT Lead · bloqueado por entrega de credenciales + endpoint
- **Entrega** – Flow PAM_DG_NotifyHotelArrivalChange · plan F3.2 ventana 2026-10-13 → 2026-10-31

OI-02 · Case automation para disputas/reembolsos

- **Qué** – Configurar queue "Disputes & Refunds" + Apex PAM_CreateCaseForDispute · reemplaza el escalate genérico
- **Hoy** – Human_Handoff usa `escalate_to_human` para dejar al socio en cola general
- **Owner** – Salesforce FDE (dev) + PAM Customer Service (queue config)
- **Entrega** – Plan F3.3 ventana 2026-10-20 → 2026-10-28

OI-03 · Retriever R2 UDMO-Destinations

- **Qué** – Enganchar KB a Destinations: Prompt Template `FWD_PPass_KB_Destinations_Response` contra UDMO Files en Data Cloud (9 fact sheets ricos)
- **Hoy** – Destinations opera solo como primer filtro conversacional sin fuente KB
- **Owner** – Salesforce FDE
- **Entrega** – Plan F3.4 ventana 2026-10-21 → 2026-10-30 · depende de F3.1 (KB 7 Draft cerrados)

OI-04 · Smoke tests end-to-end 15/15 acciones

- **Qué** – Ejecutar las 15 acciones del bundle contra datos reales de sandbox: 10 Apex + 6 Flows + 2 Prompt Templates (R1, R5)
- **Hoy** – Probadas individualmente en Preview Builder · falta validación end-to-end con persistencia de variables de sesión
- **Owner** – Salesforce FDE
- **Entrega** – Plan F3.5 ventana 2026-10-27 → 2026-10-31 (bloquea arranque de F4)

Fallback-first — todos los open items tienen plan B operando hoy.

El diseño del V5 ya absorbió los open items como escalamiento humano. Si OI-01 o OI-02 no cierran para el go-live, el agente sigue funcionando: solo cae a asesor en lugar de automatizar.

Esto permite priorizar OI-03 (R2) y OI-04 (smoke) como pre-requisitos duros, y tratar OI-01/OI-02 como mejoras post-launch si se demoran.

6 · RUTA A PRODUCCIÓN

Timeline · 7 semanas al go-live

Las 3 fases iniciales (Discovery · Foundation · Build V5) cerraron en junio-julio. Las 3 siguientes se ejecutan en octubre-diciembre. El evento Legends of Paradise (6-13 dic) es el ancla operativa que fija el deadline.

01 – 30 jun 2026 **F0 · Discovery & diseño**

13 Job Stories mapeadas · 74 docs catalogados · 6 Record Types + 4 DCGs + 5 Retrievers propuestos. Sign-off del Sponsor PAM.

01 – 10 jul 2026 **F1 · KB Foundation**

Foundation desplegada 2-jul en PAM-Sandbox. 42 artículos master + traducciones. 36 Online + 2 In Review + 4 Planned al cierre.

23 jun – 08 jul 2026 **F2 · Agent Build V1 → V5**

5 versiones iteradas. V5 Active desde 2026-07-08 con 8 subagentes + 15 acciones + auth 3 fases + guardrails estrictos.

13 – 31 oct 2026 **F3 · Pre-prod hardening (CURRENT)**

Cerrar OI-01 OWS · OI-02 disputes queue · OI-03 R2 Destinations · OI-04 smoke tests · validar 7 KB Draft. Sign-off interno FDE al cierre.

03 – 21 nov 2026 **F4 · UAT con operación PAM**

Matriz de ~40 escenarios × Customer Service + Reservations + Fraud Prevention. 3 semanas con daily standup. Reporte UAT ≥90% pass rate para sign-off.

24 nov – 05 dic 2026 **F5 · Go-live producción**

Change Set validation Sandbox → Prod · Publish Active · Embedded Messaging en Experience Cloud · dashboards KPIs · monitoreo primera semana. Target: antes del 2026-12-05.

06 – 13 dic 2026 **Legends of Paradise · AVA Resort Cancún**

Evento ancla. Pico de preguntas sobre acceso, horarios y actividades para portadores activos de Paradise Pass. El agente debe estar atendiendo tráfico real antes de esta fecha.

7 · RIESGOS ACTIVOS

Riesgos monitoreados

7 riesgos abiertos al 12-oct. Dos (R-03 schema delta Sandbox→Prod · R-04 presión del evento) son los más altos. El resto cuenta con mitigación activa o fallback funcional.

ID	RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
R-01	OWS no entrega credenciales a tiempo para F3 · Arrival_Support queda en fallback humano	MEDIA	MEDIO	Fallback humano ya funciona en V5. Si no entregan, publish igual con flujo manual y OWS en V6 post-launch.
R-02	7 KB Draft sin Content Owner firme en PAM bloquean cobertura 42/42 pre-UAT	MEDIA	MEDIO	Pedir al Sponsor PAM designar Content Owner único. Si no se consigue antes del 2026-10-24, marcar como Lifecycle=Legacy.
R-03	Divergencia schema Sandbox → Production (90 custom objects · 220 record types en Prod)	ALTA	ALTO	F5.1 validation run completo + schema diff entre Sandbox y Prod en semana del 24-nov. Rollback plan documentado.
R-04	Legends of Paradise (6-13 dic) presiona el calendario · si F4 no cierra con sign-off antes del 21-nov, no hay buffer	MEDIA	ALTO	Freeze de cambios al bundle desde el 2026-11-24. Plan B: publicar solo subagentes bajo riesgo (Auth + Membership + Critical Policies) y mantener el resto deshabilitado.
R-05	Prompt injection expone datos de otro socio tras login legítimo	BAJA	ALTO	Guardrails explícitos en system prompt + escenario dedicado en F4 UAT. Estado: mitigated.
R-06	OTP email falla por bloqueo del dominio Linx9 MaskEmail · autenticación sin fallback	BAJA	MEDIO	Monitorear tasa de errorMessage en PAM_SendOtpEmail durante F3-F4. Agregar circuit breaker + retry con backoff.
R-07	Rollback no probado antes del go-live · equipo sin runbook si aparece regresión crítica	MEDIA	ALTO	En F5.1 simular rollback a BotVersion sin actions en 10 minutos. Entregar runbook al IT Lead de PAM.

8 · PRÓXIMOS PASOS

Qué pedimos esta semana

Para que F3 cierre en calendario, necesitamos 4 cosas de PAM esta misma semana. Nada bloquea construir en paralelo lo que sí depende solo de Salesforce FDE – pero sí mueve la fecha de go-live si se retrasan.

Semana del 2026-10-13 · asks a PAM

PAM IT Lead	Confirmar fecha de entrega de credenciales + endpoint OWS. Si no se puede antes del 24-oct, mover OI-01 a V6 post-launch (fallback humano para go-live).
PAM Content Owner	Designar responsable único de los 7 KB Draft. Decidir caso por caso: validar vs. Lifecycle=Legacy. Fecha límite 2026-10-24.
PAM Customer Service	Configurar queue "Disputes & Refunds" en Service Cloud + confirmar RT y tipificación de Case. Habilita OI-02.
PAM Sponsor	Confirmar disponibilidad de equipos (CS + Reservations + Fraud) para UAT 03-21 nov. Si hay conflicto con cierre de mes o auditorías, acordar Plan B asincrónico.

Qué avanza Salesforce FDE en paralelo

- **F3.1** – Arrancar coordinación con Content Owner para validar los 7 KB Draft
- **F3.3** – Diseñar Apex PAM_CreateCaseForDispute mientras PAM Customer Service configura la queue
- **F3.4** – Construir Prompt Template FWD_PPass_KB_Destinations_Response + enganchar R2 al subagente Destinations
- **F3.5** – Preparar batería de smoke tests · ejecutar la semana del 27-oct contra datos reales de sandbox
- **F4.1** – Sembrar la matriz de ~40 test cases en el portal Laila para UAT (gracias a la foundation ya construida en el portal, esto es registro + no setup)

Si los 4 asks aterrizan esta semana, go-live el 2026-12-05 es realista.

Si alguno se retrasa >7 días, el riesgo R-04 (presión Legends of Paradise) sube de amarillo a rojo y se activa el Plan B: publicar solo Auth + Membership + Critical_Policies, mantener Destinations/Arrival/Dispute deshabilitados y abrir V6 en enero.
