




Martes · 6 de octubre 2026




PROGRAMA INSIDERS DE BETTERWARE

Betty mejorada

Un piloto cerrado con nuestras distribuidoras aliadas · del 16 al 30 de octubre 2026 · antes del rollout general.

Jonathan Gomez

Salesforce Forward Deployed Engineer · con equipo Partner

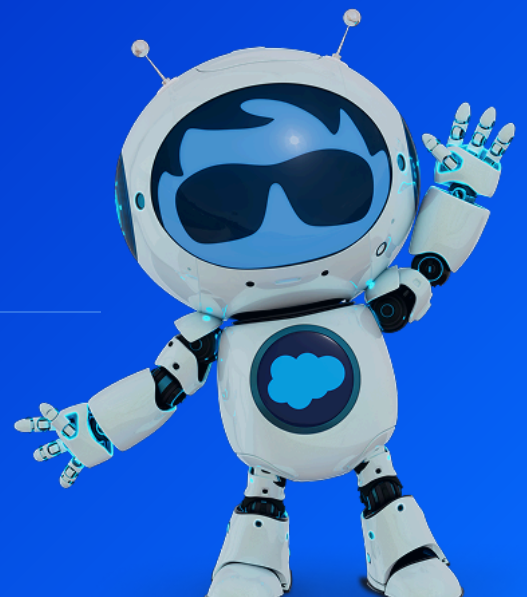

LO QUE DESCUBRIMOS

El punto de partida

Un diagnóstico honesto de lo que vemos hoy en la experiencia de Betty · y lo que ya estamos haciendo al respecto.

Los patrones acumulados

Betty hoy tiene algunos patrones que, acumulados, generan la experiencia que las distribuidoras han venido reportando: muchas conversaciones terminan transferidas, varias se abandonan, y hay flujos donde Betty responde con datos que no corresponden a la distribuidora que escribe.

Las métricas tienen una causa estructural

Los síntomas que vemos en las métricas (escalación alta, abandono alto, success estancado) no son azar – tienen una causa estructural que ya identificamos y acordamos cómo cerrar. No es un problema de contenido ni de más features: es la implementación técnica por detrás.

El trabajo ya empezó

Durante las últimas semanas construimos – con el visto bueno del Partner – una nueva implementación técnica de Betty. Misma Betty hacia la distribuidora. Mejor construida por detrás. Hoy está validada técnicamente y lista para probarse con usuarias reales.

Antes de abrir para todas, un piloto

Antes de activarla para las ~21 mil distribuidoras activas, queremos probarla con un grupo selecto que nos ayude a validar: distribuidoras aliadas, con historial de retroalimentación, representativas de distintos tipos de consultas.



Betty sigue siendo Betty.

La misma persona. El mismo canal. El mismo tono.
Lo que cambia es la implementación técnica por detrás: menos fallos, respuestas más claras, mayor fiabilidad.

No es un Betty 2.0

LA PROPUESTA

Programa Insiders · un grupo exclusivo

Un piloto cerrado de dos semanas con quienes más impactan al negocio: las distribuidoras aliadas que ya nos han dado su voz.

Tamaño del grupo	15 a 25 distribuidoras aliadas , cuidadosamente seleccionadas por Betterware Customer Success.
Perfil propuesto	Super usuarias activas · con historial de retroalimentación · representativas de distintos tipos de intents (saldos, pedidos, puntos, altas, cobranza).
Duración	Dos semanas: 16 al 30 de octubre 2026. Cutover controlado el viernes 16 con monitoreo intensivo las primeras 48h.
Canal de feedback	Grupo WhatsApp dedicado + formulario rápido semanal con 3 preguntas: ¿qué funcionó? · ¿qué no? · ¿qué cambiarías?
Reconocimiento	A definir con Betterware · mención interna, acceso temprano a próximas mejoras, pin digital, certificado de participación. <i>El reconocimiento es público.</i>
Comunicación	Mensaje de bienvenida de Betterware (no de Salesforce) · onboarding corto · canal directo con Customer Success de Betterware durante toda la ventana.

LO QUE ENTRA · LO QUE NO

Alcance explícito del piloto

Esta lista va **en la invitación formal** a las piloto. Transparencia desde el día cero para evitar expectativas infladas.

Dentro del alcance

- ✓ Autenticación por código de distribuidora o referencia bancaria
- ✓ Consulta de saldos y pagos
- ✓ Consulta de pedidos y seguimiento
- ✓ Consulta de puntos BwPlus
- ✓ Consulta y registro de altas de asociadas
- ✓ Tickets ServiceNow
- ✓ Reseteo de contraseña
- ✓ Preguntas generales (FAQ)
- ✓ Escalación cuando aplica

Fuera del alcance

- ✗ Features nuevas que hoy Betty no hace
- ✗ Canales distintos a WhatsApp
- ✗ Cambios en el programa BwPlus, Credilazos u otros productos
- ✗ Cambios en el back office
- ✗ Nuevos idiomas o regiones
- ✗ Modificaciones al modelo de datos
- ✗ Integraciones con sistemas externos nuevos

Por qué importa este alcance

El objetivo del piloto es **validar que Betty mejorada responde mejor en los flujos que ya hace hoy**. No agregar funcionalidad nueva, no replantear el servicio. Esto protege a Betterware de scope creep y nos deja medir con rigor el impacto de la mejora técnica.

PROPUESTA DE DIVISIÓN

Responsabilidades · tres equipos, una Betty

Cada equipo aporta lo que mejor sabe hacer. Separación clara, coordinación cerca.

SALESFORCE · FDE

- › Diseño técnico del piloto
- › Deploy del agente nuevo con feature flag
- › Framework de medición A/B
- › Playbook del programa (narrativa, invitación, formulario)
- › Monitoring + reporte semanal del comportamiento
- › Demo de aprendizajes al cierre

**PARTNER
IMPLEMENTADOR**

- › Visto bueno técnico a la arquitectura
- › Approval del deploy a producción
- › Soporte operativo durante el piloto
- › Primer nivel de soporte técnico si surge
- › Testing interno pre-cutover

BETTERWARE · USTEDES

- › Curaduría de las 15-25 distribuidoras candidatas
- › Invitación formal con la narrativa del programa
- › Grupo WhatsApp de las piloto
- › Punto de contacto para dudas de las piloto
- › Reconocimiento final al cerrar el piloto

Por qué este orden

La invitación a las piloto **viene de Betterware, no de Salesforce**. Ustedes son quienes conocen a sus distribuidoras aliadas, construyeron la relación y pueden extender el reconocimiento. Nosotros aportamos la técnica + la medición + el playbook. El Partner garantiza el deploy limpio y la operación durante la ventana.

LAS PRÓXIMAS 4 SEMANAS

Timeline del piloto

Lo que Betterware necesita hacer en cada punto · claridad total.

- **Esta semana (07-10 oct):** Betterware cura la lista de 15-25 distribuidoras aliadas · Salesforce + Partner alistan la técnica.
- **Lun 13-oct:** Lista final cargada en el sistema · configuración de piloto lista.
- **Mié-Jue 14/15-oct:** UAT con muestra de 2-3 piloto · smoke test en producción con feature flag OFF.
- **VIE 16-OCT: ACTIVACIÓN** · Betty mejorada entra para las piloto · grupo WhatsApp abierto · mensaje de bienvenida de Betterware.
- **Vie 23-oct:** Checkpoint 1 · formulario semanal · reporte comparativo A/B al Partner y Betterware.
- **VIE 30-OCT: Cierre del piloto** · formulario final · demo de aprendizajes · reconocimiento a las piloto.
- **Lun 02-nov en adelante:** Decisión informada de rollout gradual al general · con evidencia dura de dos semanas de operación real.

CÓMO MEDIREMOS EL ÉXITO

Métricas del piloto

Estas métricas son **distintas** de los KPIs de producción · son más experienciales. No tratan de medir volumen, tratan de medir si Betty mejorada entrega lo que promete.

Metas del Programa Insiders

NPS cualitativo del grupo piloto	≥ 70% recomendaría
% de intents validados funcionando correctamente	≥ 85% de los flujos
Bugs críticos abiertos al cierre	0 críticos
Lista de insights para iteraciones futuras	Insumo de roadmap

Las métricas de producción (deflection, escalation, abandon) también se miden

Durante las 2 semanas comparamos el comportamiento del grupo piloto (agente nuevo) vs. el resto del tráfico (V40). Es un A/B natural que nos deja evidencia dura para la decisión del 2 de noviembre. Pero esas métricas no son el objetivo del piloto – el objetivo es validar la experiencia con usuarias reales.

3 ASKS CONCRETOS A BETTERWARE

Lo que pedimos de ustedes

Tres compromisos puntuales para habilitar el piloto. Nada más.

1

Confirmar el concepto

Del Programa Insiders al cierre de esta reunión. Luz verde para arrancar hoy mismo.

2

Entregar lista final

Lista de 15-25 distribuidoras aliadas · a más tardar el **lunes 2026-10-13**.

3

Comprometer a su CS

El equipo de Customer Success de Betterware como punto de contacto directo con las piloto durante las 2 semanas.

Y una invitación

Si Betterware lo considera, extender un **reconocimiento público** a las piloto al cierre del programa – mención interna, pin digital, acceso temprano a futuras mejoras, certificado. Transforma a quienes se habían manifestado en embajadoras del cambio. El formato queda a elección de Betterware.

POR QUÉ ESTE PROGRAMA

El retorno para Betterware

Más allá de arreglar lo técnico, el Programa Insiders deja cuatro activos tangibles para el negocio.

★ Experiencia tangible mejorada para quienes más impactan al negocio

Las super usuarias – las que generan más conversaciones, pedidos y relación con asociadas – son las primeras en ver la mejora. El impacto se siente en la red donde más duele hoy.

★ Evidencia dura antes del rollout general

Dos semanas de operación con usuarias reales dan la certeza para abrir Betty mejorada a las ~21 mil distribuidoras activas sin sorpresas.

★ Las piloto se convierten en embajadoras del cambio

Al cerrar el programa, las piloto son quienes mejor pueden comunicar lo que cambió. Son las voces que Betterware necesita internamente para apoyar el rollout.

★ Base de datos de feedback estructurado para el roadmap

El formulario semanal + grupo WhatsApp dejan un corpus de insights que sirve para los próximos trimestres: qué temas abrir, qué iteraciones priorizar, cómo evolucionar a Betty después del piloto.

Jonathan Gomez · Salesforce Forward Deployed Engineer

Con el equipo del Partner implementador

Octubre 2026
